PLANNING DES TRAVAUX - 2021/2022/2023
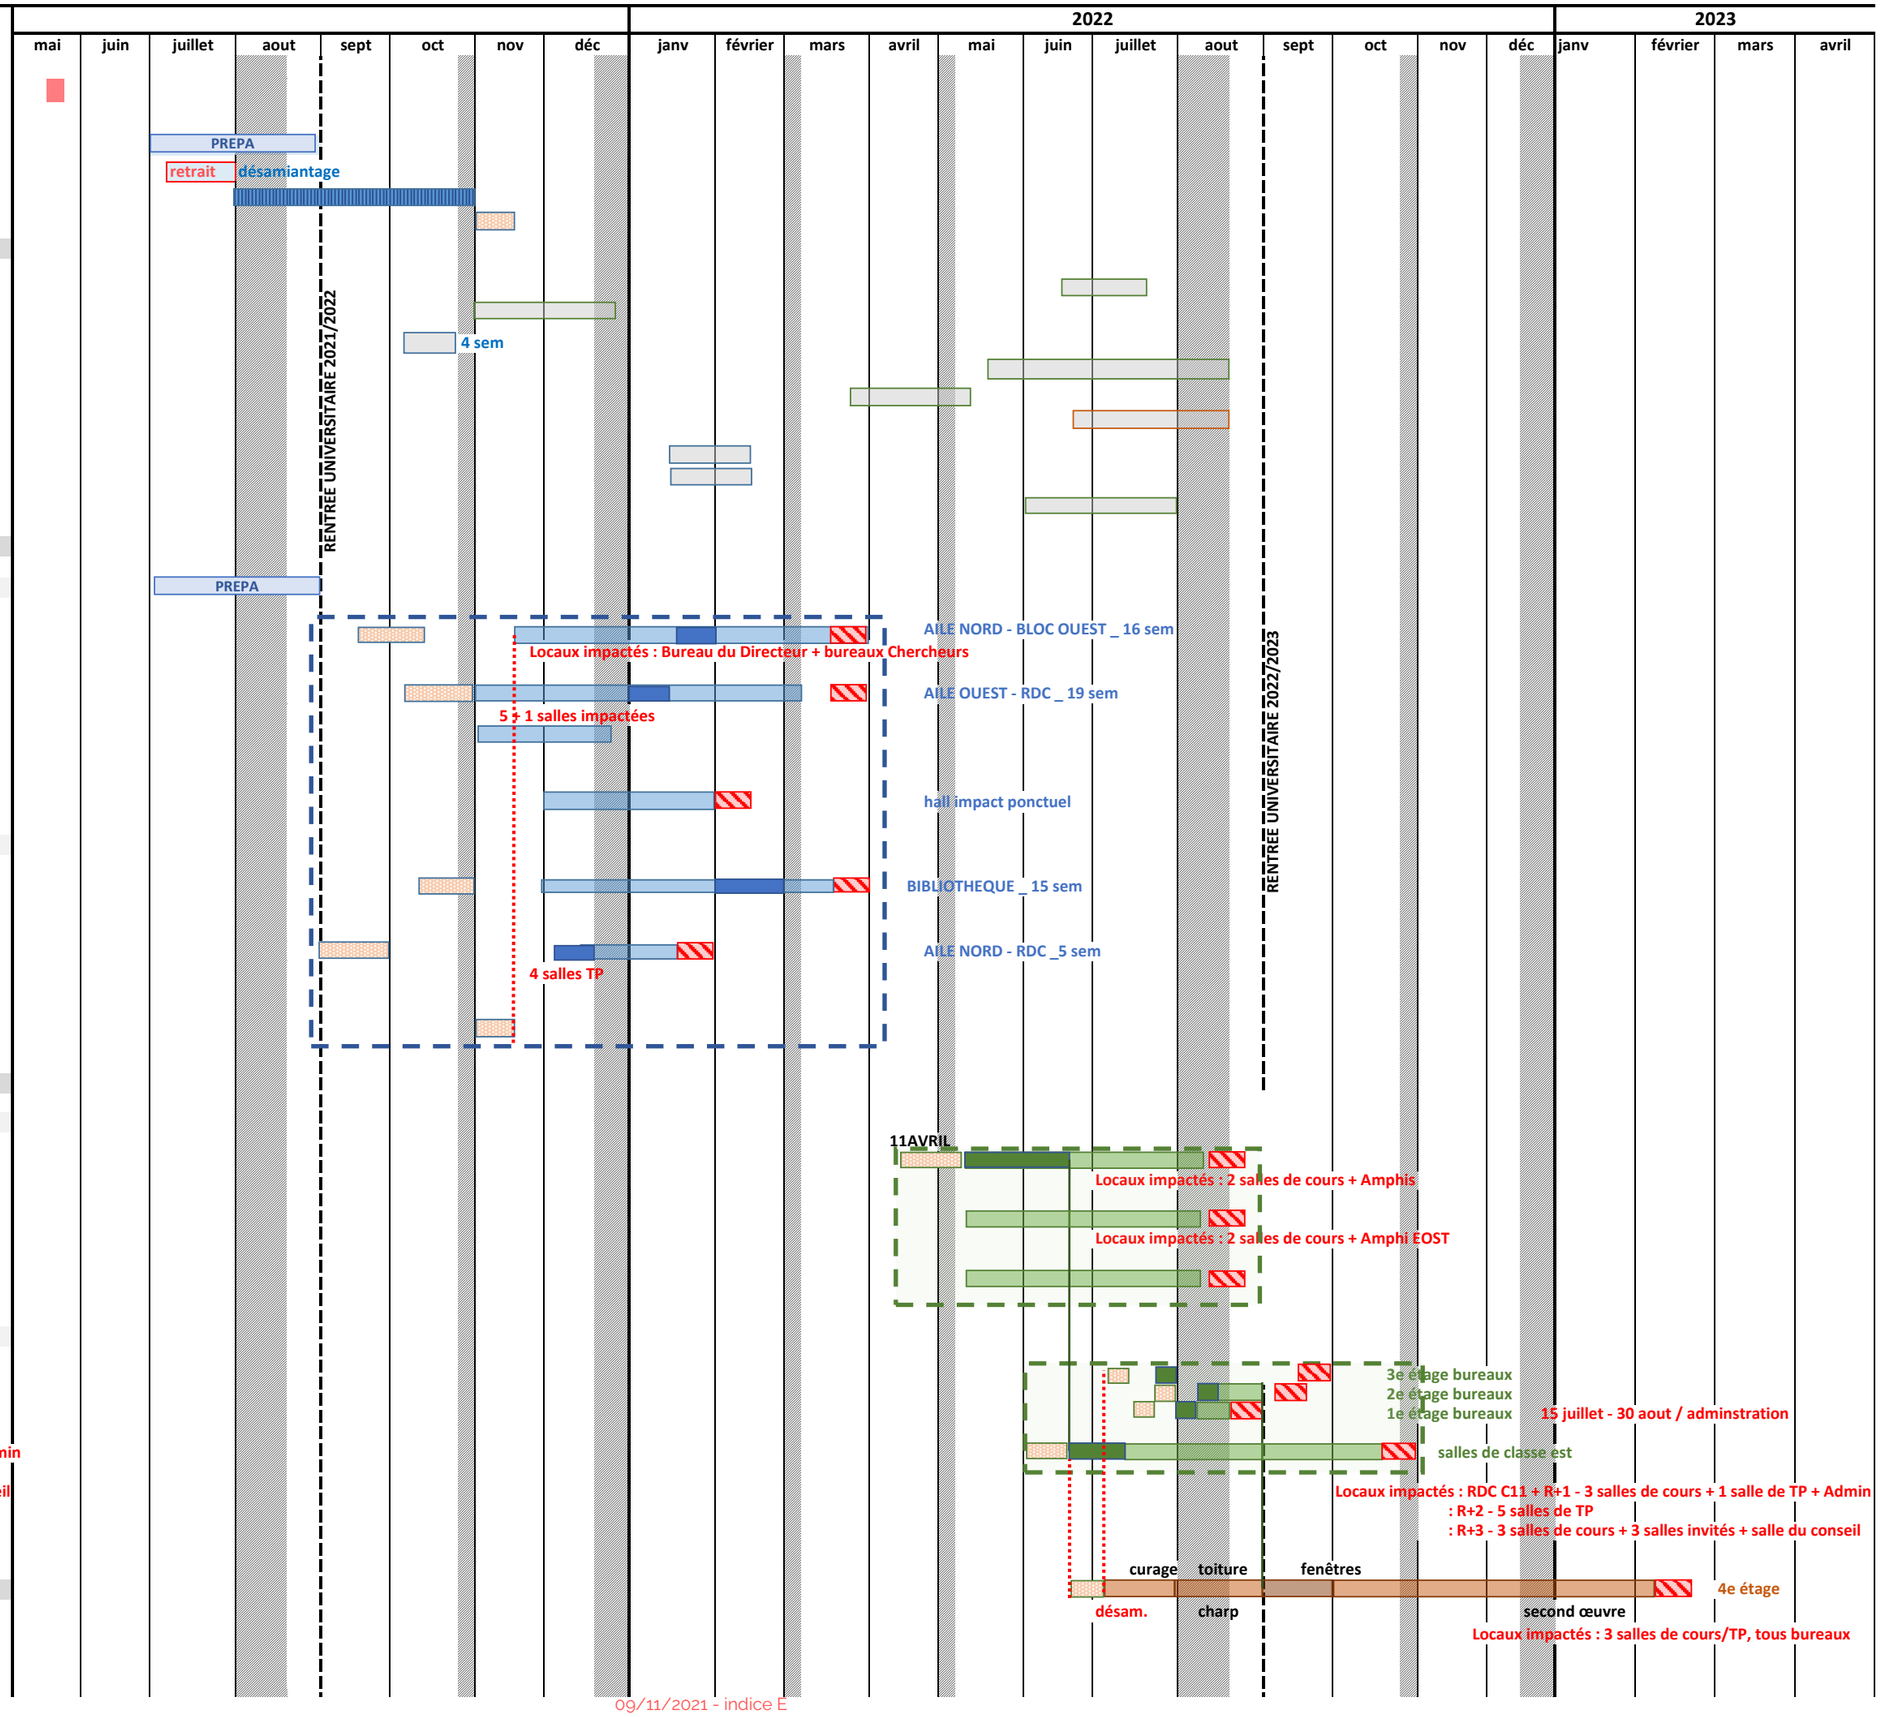
N°	désignation	durée
	RECEPTION DES OFFRES	19-mai
	NOTIFICATION DES MARCHES	juillet
	PREPARATION	2 mois
	DESAMIANTAGE: PLAN DE RETRAIT	1 mois
	DESAMIANTAGE: première phase	
	VIDE SANITAIRE DESAMIANTAGE	
	TRAVAUX EN TEMPS MASQUE : extérieurs et façades	
	AILE SUD : isolation + réparation	6 sem
	AMPHITHEATRES: travaux en toiture	8 sem
	Remplacement des lanterneaux en toiture RDC	4 sem
	FACADE SUD ET TERRASSE R+4: isolation + réparation	16 sem
	FACADE NORD ET R+4: isolation + réparation	7 sem
	CAGES D'ESCALIER 1 -2 - 3: isolation + menuiseries ext.	9 sem
	ACCES NORD-OUEST: PMR	3 sem
	AILE OUEST: isolation + réparation	6 sem
	GRAND PATIO: isolation + réparation + rampes PMR	6 sem
	PHASE A	
	PHASE A 01 : BLOC OUEST AILE NORD + RDC AILE OUEST	
	Phase A 01 - AILE NORD _ BLOC OUEST Locaux impactés : Bureau du Directeur + bureaux Chercheurs	14 sem
	Phase A 01 - AILE OUEST RDC _ SALLES + CIRCULATIONS	17 sem
	Phase A 01 - ENTRESOL	8 sem
	Phase A 01 - Hall	4 sem
	PHASE A 02 : BIBLIOTHEQUE + RDC AILE NORD	
	Phase A 02 - BIBLIOTHEQUE OPR et levées de réserves / emménagement	15 sem
	Phase A 02 - AILE NORD RDC _ SALLES + CIRCULATIONS OPR et levées de réserves / emménagement Locaux impactés : 3 salle de TP + salle du Magistère	5 sem
	VIDE SANITAIRE DESAMIANTAGE	
	PHASE B	
	PHASE B 01 : RDC EST / HALL + RDC AILE SUD	
	Phase B 01 - RDC EST _ HALL + SALLES Locaux impactés : 2 salles de cours + Amphis	14 sem
	Phase B 01 - AILE SUD _ SALLES + AMPHI EOST Locaux impactés : 2 salles de cours + Amphi EOST	13 sem
	Phase B 01 - AMPHITHEÂTRES	14 sem
	PHASE B 02 : BLOC EST AILE NORD + ETAGES AILE NORD	
	Phase B 02 - AILE NORD R+1 et ETAGES Locaux impactés : bureaux Admin + Chercheurs	10 sem
	Phase B 02 - AILE NORD _ BLOC EST Locaux impactés : RDC C11 + R+1 - 3 salles de cours + 1 salle de TP + Admin : R+2 - 5 salles de TP : R+3 - 3 salles de cours + 3 salles invités + salle du conseil	16 sem
	PHASE R+4	8 mois
0	déménagement Locaux impactés : 3 salles de cours/TP, tous bureaux
